



ZACATECAS
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISMUN-02/24

CONTRATISTA: ING. LUIS MIGUEL CASTILLO GODINA

R. F. C. OCV130124PV1

En el sitio que ocupa la obra de PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, FRACCIONAMIENTO BARROS SIERRA, ZACATECAS, ZAC. del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 12:00 horas del día 19 de Marzo del 2025 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO,
FRACCIONAMIENTO BARROS SIERRA, ZACATECAS, ZAC.

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la **entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:

ING. LUIS MIGUEL CASTILLO GODINA

Por parte del Organo Interno de Control:

Nombre:

ING. JESUS GONZALEZ LUNA

Por parte de los beneficiarios:

Nombre:

Por parte del Residente

Nombre

ARQ. VIRGINIA M. VARELA ESQUIVEL

Por Direccion Gral. De Solidaridad y Desarrollo Humano

Nombre:

LIC. VERONICA MARIA VAZQUEZ MORUA



ZACATECAS
2024 - 2027

Los representantes municipales, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 729.71M2, DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE 13.95M3, EXCAVACION EN CORTE 214.45M3, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA 91.91M3, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA 183.81M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION 123.75M3, REPARACION DE TOMAS DE AGUA 4.00PZAS., DESCARGA SANITARIA 1.00 PZAS., REUBICACION DE POSTE DE TELMEX 1.00PZAS., REGISTRO DE TABICON 1.00PZAS., TALA Y PODA DE ARBOL 1.00PZAS., CONSTRUCCION DE LOSA EN CAJA DE VALVULAS 1.00PZAS., PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 250KG/CM2 535.22M2, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE 103.62M2, CONSTRUCCION DE GUARNICION 105.10ML., CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO 17.84ML., PINTURA EN GUARNICION 105.10ML., CONSTRUCCION DE LAVADERO DE CONCRETO 1.00ML.

En la Colonia: CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, FRACCIONAMIENTO BARROS SIERRA, ZACATECAS, Z/

Modalidad de contratación:

Por Adjudicación Directa

Importe del contrato (I. V. A. incluido):

\$805,971.36

OCHOCIENTOS CINCO MIL
Con letra: NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
36/100 M.N.

Fianza de Anticipo:

\$241,791.40

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
Con letra: SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
40/100M.N.

No. De Fianza: 3502-17627-9

De fecha: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

Aseguradora: ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de Cumplimiento:

\$80,597.14

OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
Con letra: SIETE PESOS 14/100 M.N.

No. De Fianza: 3502-17625-9

De fecha: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

Aseguradora: ASERTA S.A. DE C.V.

Fianza de Vicios ocultos

\$80,597.14

OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
Con letra: SIETE PESOS 14/100 M.N.

No. De Fianza: 3502-17722-5

De fecha: 28 DE FEBRERO DEL 2025

Aseguradora: ASERTA S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 4 DE DICIEMBRE DEL 2024 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 TERMINO: 28 DE FEBRERO DEL 2025

Número de Convenio Modificadorio:

PMZ-FAISMUN-02/24-P

CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO

Causa(s) de la modificación: AL CORTO TIEMPO DE PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA Y POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS Y MOTIVOS TECNICOS DE EJECUCION DE LA OBRA



ZAGATECAS
2024 - 2027

**Importe final
autorizado:**

\$

805,971.36 Con letra:

OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$241,791.40	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100M.N.	

Estimación 1	31 DE DICIEMBRE DEL 2024 20 DE ENERO DEL 2025	\$248,919.28	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.	
Estimación 2	31 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	\$557,052.08	QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100M.N.	
Finiquito				
Importe total de estimaciones		\$805,971.36	OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	

Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2024	\$805,971.36			\$805,971.36

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista ING. LUIS MIGUEL CASTILLO GODINA y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. aclaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.




ZAGATEGAS
2024 - 2027


Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.


Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:


Por la Instancia Ejecutora


ARQ. VIRGINIA M. VARELA ESQUIVEL
RESIDENTE DEL MUNICIPIO


ING. EDUARDO ORTIZ MENCHACA
ENCARGADO DEL DEPTO. DE SUPERVISION


ING. LUIS FERNANDO MALDONADO MORENO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA

Por la Empresa


ING. LUIS MIGUEL CASTILLO GODINA
CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL

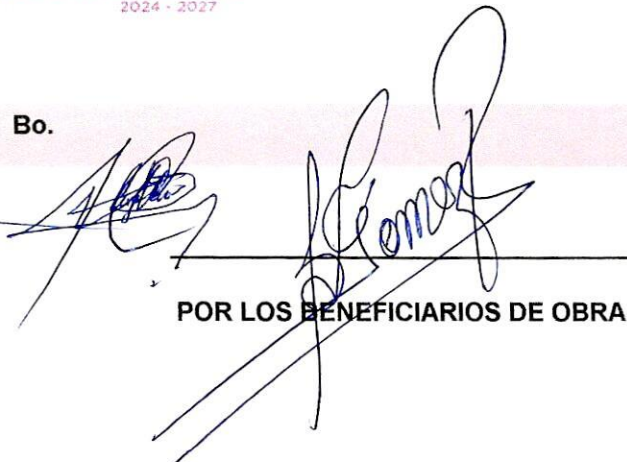

ING. LUIS MIGUEL CASTILLO GODINA
RESIDENTE



ZAGATECAS
2024 - 2027

Vo. Bo.


ING. JESUS GONZALEZ LUNA
POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO


POR LOS BENEFICIARIOS DE OBRA


LIC. VERONICA MARIA VAZQUEZ MORUA
DIRECCION GENERAL DE SOLIDARIDAD Y
DESARROLLO HUMANO

NOTA: LA FIRMA DE LA PRESENTE, NO EXIME DE POSIBLES REVISIONES FUTURAS POR LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA



CC

