

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: P12524 Del 18/12/2025

Concepto: PAGO DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS AL PROGRAMA FAISMUN 2025.. GD Compra : 4586 Factura: 2819, 2302 RUELAS AMBRIZ BRANDOM ALFREDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-412001-520-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$14,118.00		FE:511, GD Compra : 4586 Factura: 2819, 2302 RUELAS AMBRIZ BRANDOM ALFREDO
0002	8240-511-412001-520-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$14,118.00	FE:511, GD Compra : 4586 Factura: 2819, 2302 RUELAS AMBRIZ BRANDOM ALFREDO
0003	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$14,118.00		FE:511, GD Compra : 4586 Factura: 2819, 2302 RUELAS AMBRIZ BRANDOM ALFREDO
0004	2112-1-002302	RUELAS AMBRIZ BRANDOM		\$14,118.00	FE:511, GD Compra : 4586 Factura: 2819, 2302 RUELAS AMBRIZ BRANDOM ALFREDO
Sumas iguales =>			28,236.00	28,236.00	

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Santander

609352

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC 080122042078

Usuario: 37391920 - EDITH CARRILLO IBARRA

Referencia: 8U149

Referencia
numérica del
Emisor:

Referencias del

Movimiento: 7783089

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014225180003148760

Cuenta Cargo: 18000314876 - FONDO III 2025

Cuenta Abono: 012180015774673734 - RUELAS AMBRIZ BRANDON ALFREDO

Importe: \$ 13,965.87 MXN

Concepto: FAC 02819

Fecha y hora de

Alta: 25/03/2026 14:57:29

Fecha y hora de

Liquidación: 25/03/2026 14:57:31

Clave de

Rastreo: 20260325400140BET0000477830890

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: MZA850101PK4

Importe IVA:

T 64

Email del
Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Operación realizada por Internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 6 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

600353



ZAGATEGAS

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS

Cuenta por liquidar certificada para registro del ejercicio presupuestario y orden de pago (C.L.C.)

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Número de C.L.C.

G/CB520-94

Fecha: 23-mar-2026

Número de devengo

23129

Área del Solicitante

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA

Banco

BBVA BANCOMER

Clave de la Secretaría

520

Cuenta

1577467373

No. Contrarecibo:

23129

Clave Interbancaria

012180015774673734

R.F.C. de la persona Física o Moral: RUAB970914PZ2

Nombre de Proveedor, Contratista o Beneficiario: RUELAS AMBRIZ BRANDON ALFREDO

Clasificación presupuestaria				No. de orden de pago	Fecha de cancelación	Saldo de cancelación	Saldo de cancelación	Saldo de cancelación	Saldo de cancelación	Saldo de cancelación	Saldo de cancelación
Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad								
513	2112-1-2302-0-0-0			1	02819	18/12/2025	12,170.69	1,947.31	14,118.00		X
RETENCION	2117-02-01-007-0-0			2					-152.13		
Total									13,965.87		

Importe con letra (TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.)

DESCRIPCIÓN:

PAGO DE SEGUIMIENTO A OBRAS DEL FAISMUN 2025 CONTRATO FMZ-FAISMUN-IND-CPS-01/2025

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL25 MAR. 2026 11:70
RECIBIDO
PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES

Elabora:

NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Solicitante:

MTRO. LUIS FERNANDO
MALDONADO MORENO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Valida:

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ

ORGANISTA

SÍNDICA MUNICIPAL

Autoriza:

HEBERTO NEBLINA VEGA

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE
TESORERÍA Y FINANZAS

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SU ART. 85 EL CUAL SEÑALA: "EL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES AUXILIARÁ DE SUS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA Y PARAMUNICIPAL" ART. 105 FRACC. XXIV QUE SEÑALA SOBRE LAS FACULTADES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO, FIRMANDOAS DONDE SEÑALA QUE ES FAMILIAR Y DEDICACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO, FIRMANDOAS MANIFESTADAMENTE CON EL SÍNDICO. "ART. 106 FRACC. II FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL. "VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LEY DE FACULTAD AL TESORERO MUNICIPAL. "TENER A LOS PROYECTOS DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA". LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBEN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESCRITA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUEDENDO RATIFICAR UNA EROGACIÓN SI SE CONSIDERA LÍCITA PARA LOS INTERESES DEL MUNICIPIO, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

000354

RFC emisor: RUAB70074A0B-4C
 Nombre emisor: BRANDON ALFREDO REYES AMARIZ
 Folio: 1
 RFC receptor: MZA850111P-1
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE ZACATECAS ZAC
 Código postal del receptor: 98040
 Régimen fiscal: Personas Morales con fines no lucrativos
 Régimen fiscal receptor:
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 51AB70074A0B-4C7A0-9043-269233302819
 No. de serie del CSD: 00001000006512987990
 Serie: A2501
 Código postal, fecha y hora de emisión: 980872025-12-18 10:45:13
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
00111111		1	111	Unidad de servicio	12,170.69	12,170.690000		Objeto de impuesto		
Descripción	SEGMENTO A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COPRADA LOS LOMAS DE ORAZCO SEGMENTO A REHABILITACION EDIFICIO E REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION EDIFICIO Y PLAZA Y CONSTRUCCION DE MURO EN DONATO GUERRA COL INSURGENTES SEGMENTO 3 REHABILITACION DE RED E DRENAJE EN CALLE JOSE GOMEZ CERVANTES CORONA COL CARLOS HINOJOZA PUTUT ZAC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Excluido	12,170.690000	Tasa	16.00%	1,947.310400
					ISR	Retenido	12,170.690000	Tasa	1.25%	152.133625
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 12,170.69
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,947.31
 Impuestos retenidos ISR \$ 152.13
 Total \$ 13,965.87

Sello digital del CFDI:

byy+51VDq0GjH+7Nj7JNesR0GRSvwpXmns3AV+7NdHxP0z2P/VmYuuKw2pGkkKtUrT5+smvVvCB/KekR5DR7VUZCKE1REST53vUQdZjK5uwrPPP45TMnKLWuz4NK6RAKpg/A4ASBCusc6aCbieUY5VgtW2W08Y5SICxolpdlT6/0U7q0D6XVYUg91fsv6RcRkelzeHtC63CkHdMX6eMlIsag62gqgtOq2brJQIBxvgtwBb3AbPVZkeNohXsdw26FST7epkusNq3z5gWP461taQ1R7Kwpa1xCKRHwQ1gR28H1PAMYswHnSqGxPlc8DhG17x42oWsgJg==

Sello digital del SAT:

d629vW4ec77eKJEsO1p5XU6ZvuuqW40Nenzd8eCFE5o3s6VME0mEX8RdWGIXDUwrePhDdu4XTSmr5Nan2wA81KvCNBxyEkZvtQYepQRsdR6ZuDbXAVjCDAOJcQITSSupemuF6MI0gK8YLn71HJohn9KKROzWW14gaWF08EXYvswJEKJIOUgCzd7eTBTa5X1+TGV4:1rM4dM/zvzB3+LSQV6MfUqKq0LhGivCZM8GfWnYnLcw4+17HkR2eSOJekY06eSNYZoVpzhcw516ASyN9GqpSPcaz1Uj6USMEhW4hDoZaV7VFdq1vEhFdwIT2MmliGfPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1] 115BAB70074A0B-4C7A0-9043-269233302819|2025-12-18T10:45:13|SAT970701NN3|byy+51VDq0GjH+7Nj7JNesR0GRSvwpXmns3AV+7NdHxP0z2P/VmYuuKw2pGkkKtUrT5+smvVvCB/KekR5DR7VUZCKE1REST53vUQdZjK5uwrPPP45TMnKLWuz4NK6RAKpg/A4ASBCusc6aCbieUY5VgtW2W08Y5SICxolpdlT6/0U7q0D6XVYUg91fsv6RcRkelzeHtC63CkHdMX6eMlIsag62gqgtOq2brJQIBxvgtwBb3AbPVZkeNohXsdw26FST7epkusNq3z5gWP461taQ1R7Kwpa1xCKRHwQ1gR28H1PAMYswHnSqGxPlc8DhG17x42oWsgJg==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-12-18 10:45:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO FONDO PARA LA
 INFRAESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/1 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5BAB7007-4A0B-4CA0-9043-269233362819" FechaTimbrado="2015-12-18T10:45:34" RfcProvCertif="SAT970701NN3" SelloCFD="Byy+51VDq0GI1+7Nj7JNesR0GRSvmpxHns3AV+f9Nd/dHXf10z2P/VmYuuKw2p/rGkkKTuRT5+smvVvCB/KekRSDR7VUZCKE1REST53vUQdZjKj5uWzFPP45TMnKLW/uz4MK6RAKpg/NoCertificadoSAT="00001000000705250068" SelloSAT="d629vW4ec77eKTEsOJp5XUG2vvuqW40Ncnzd8eCFE5o3s6VMF0mEXBRdWG1XDUwi+oPbf0du4XTSmY5Nort2wA81KtvCX0xyE/KZvt1QYepQRsdR6ZuDIzXAVJCDAC0zCQf755Supem" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto>
    <cfdi:Traslado Base="12170.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.150000" Importe="1947.310400"/>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Base="12170.690000" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.012500" Importe="152.133625"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1947.31" TotalImpuestosRetenidos="152.13">
  <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="152.13"/>
  </cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="12170.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.150000" Importe="1947.31"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <rfd:TimbreFiscalDigital xmlns:rfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5BAB7007-4A0B-4CA0-9043-269233362819" FechaTimbrado="2015-12-18T10:45:34" RfcProvCertif="SAT970701NN3" SelloCFD="Byy+51VDq0GI1+7Nj7JNesR0GRSvmpxHns3AV+f9Nd/dHXf10z2P/VmYuuKw2p/rGkkKTuRT5+smvVvCB/KekRSDR7VUZCKE1REST53vUQdZjKj5uWzFPP45TMnKLW/uz4MK6RAKpg/NoCertificadoSAT="00001000000705250068" SelloSAT="d629vW4ec77eKTEsOJp5XUG2vvuqW40Ncnzd8eCFE5o3s6VMF0mEXBRdWG1XDUwi+oPbf0du4XTSmY5Nort2wA81KtvCX0xyE/KZvt1QYepQRsdR6ZuDIzXAVJCDAC0zCQf755Supem" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

609356

**DIRECCION GENERAL DE SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
HUMANO****ZACATECAS****INFORME DE ACTIVIDADES****INFORMACION GENERAL**Nombre: **ARQ. BRANDON ALFREDO
RUELAS AMBRIZ**ID: **6082**Modalidad: **Municipal**Fecha de inicio de prestación de servicios: **01 de
Octubre del 2025**Obra reportada: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
EN CALLE COFRADIA LOCALIDAD LOMAS DE BRACHO
ZACATECAS
FOLIO MIDS: 59271**Delegación Municipal: **Zacatecas**Jefe director: **Dra. Nancy Espinoza Medina.**Dirección: **DIRECCION GENERAL DE SOLIDARIDAD Y
DESARROLLO HUMANO**Teléfono celular: **492-195-3634**

NOMBRE DE LA OBRA		CANTIDAD	PRECIO
	VERIFICACION		
	SEGUIMIENTO 1		
	SEGUIMIENTO 2		
	SEGUIMIENTO 3	1	\$4,706.00
	TOTAL	1	\$4,706.00


**ARQ. BRANDON ALFREDO RUELAS
AMBRIZ****PRESTADOR DE SERVICIOS**
**DRA. NANCY ESPINOZA
MEDINA****DIRECTORA****DIRECCION GENERAL DE SOLIDARIDAD
Y DESARROLLO HUMANO**
**LIC. MARIA VERONICA VAZQUEZ
MORUA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(TECNICO MIDS)****OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



DIRECCION GENERAL DE SOLIDARIDAD Y DESARROLLO HUMANO




ZACATECAS

3º SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (TERMINO DE LA OBRA)

RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL

Posteriormente de haber realizado la rehabilitación de la línea de drenaje, las tomas y descargas domiciliarias comienzan los trabajos de relleno y compactado de zanja para intervenir con la base de petatillo para la ejecución de la pavimentación, en este concepto se interviene el 70% de tramo lineal con maquinaria pesada, así mismo de la conformación y nivelación de la calle sacando los niveles correspondientes para la circulación de las aguas pluviales de forma correcta, estos trabajos se llevaran a cabo en dos días.

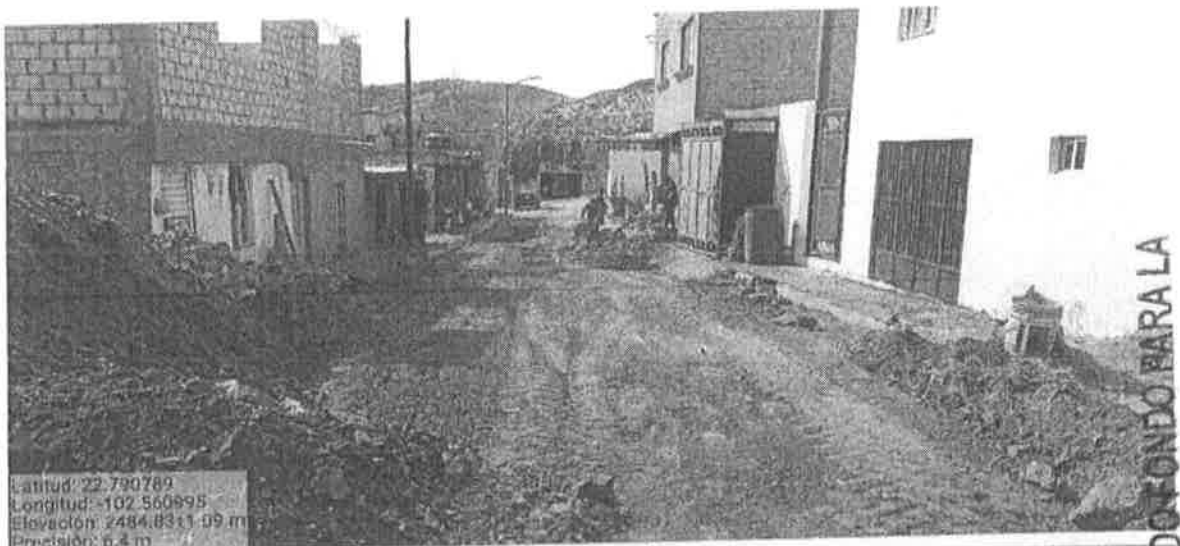

Latitud: 22.790789
Longitud: -102.560595
Elevación: 2484.831109 m
Precisión: 6.4 m



Latitud: 22.79067
Longitud: -102.561043
Elevación: 2478.031297 m
Precisión: 6.5 m

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



DIRECCION GENERAL DE SOLIDARIDAD Y DESARROLLO HUMANO




ZACATECAS

3. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (TERMINO DE LA OBRA).

CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR

Así mismo de haber concluido con la compactación de material inerte comienzan con los trabajos de la construcción de pavimentación a base de adoquín y juntas de concreto, en este concepto de trabajo se realizaron con dos viajes de piedra para completar los metros lineales establecidos para el proyecto, así mismo se realizan la construcción de las rampas de cochera mismas que deben de llevar el nivel de terreno ya construido, estos trabajos se realizaron aproximadamente en 20 días.

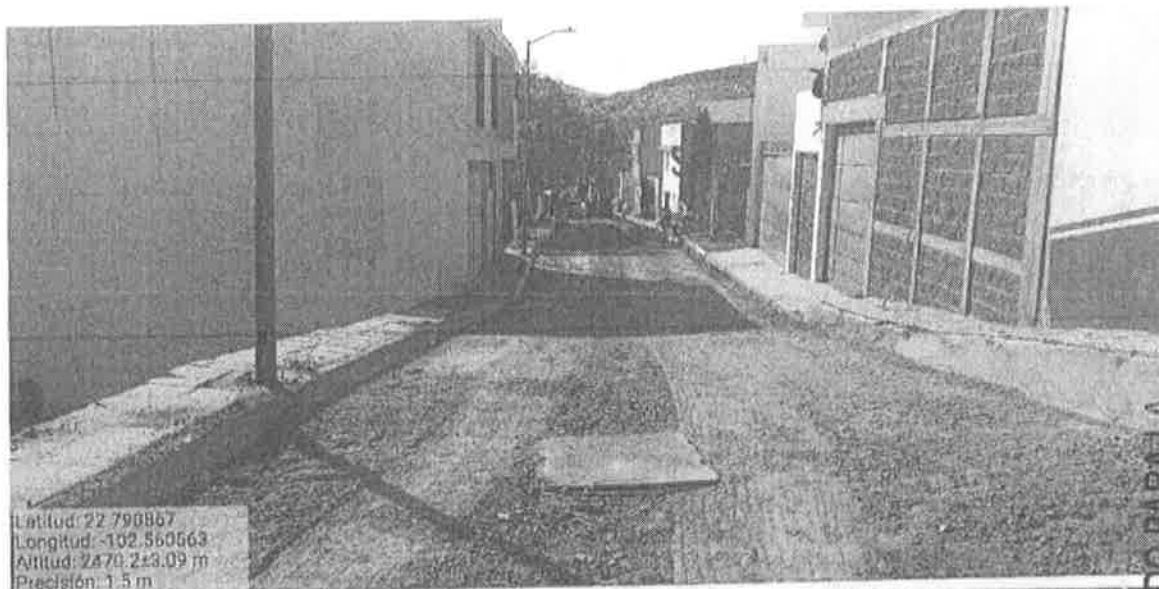

Latitud: 22.790867
Longitud: -102.560663
Altitud: 2470.213.09 m
Precisión: 1.5 m



Latitud: 22.790814
Longitud: -102.560861
Elevación: 2483.6311.14 m
Precisión: 1.5 m

OPERADO FONDOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



DIRECCION GENERAL DE SOLIDARIDAD Y DESARROLLO HUMANO




ZACATECAS

3 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (TERMINO DE LA OBRA).

CONSTRUCCION DE GUARNICION A BASE DE ADOQUIN DE 40 X 40 CM DE 12 A 15 CM DE ESPESOR

Posteriormente se trabaja en la construcción y rehabilitación de guarniciones y banquetas de los 32 ml establecidos en el proyecto, en este concepto se trabaja también en la rehabilitación de banquetas donde fueron rehabilitados los registros sanitarios de los domicilios con las tapas y la plancha de concreto, así mismo de rematar las rampas de cocheras con el nivel de pavimento ya ejecutado.

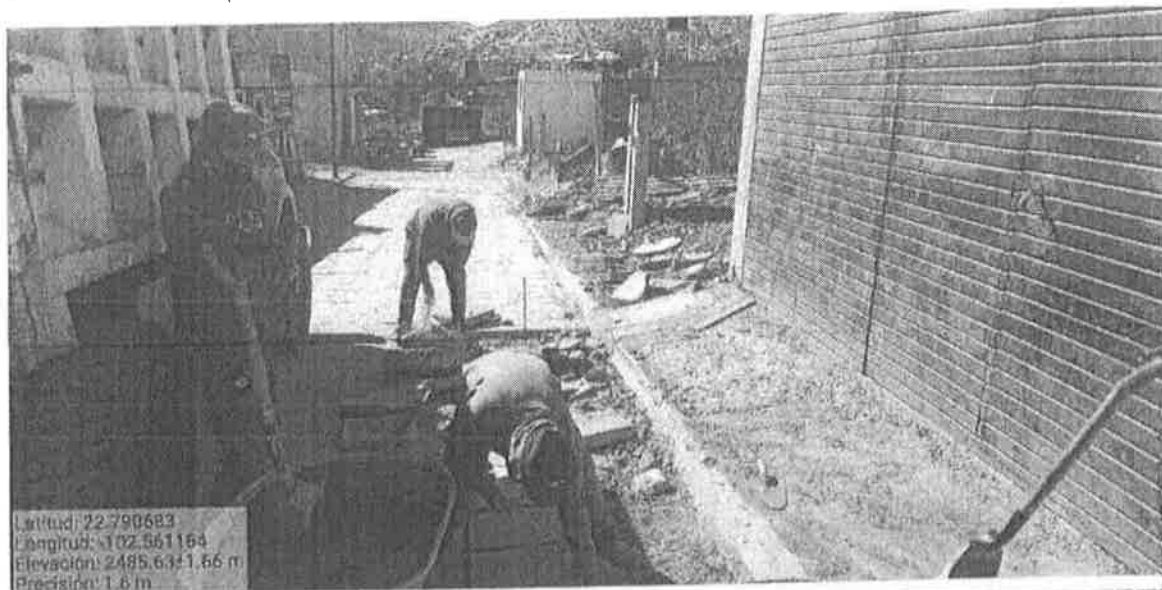

Latitud: 22.790683
Longitud: -102.561164
Elevación: 2485.63±1.66 m
Precisión: 1.6 m



Latitud: 22.790838
Longitud: -102.560473
Elevación: 2485.03±1.84 m
Precisión: 12.88 m

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



3. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (TERMINO DE LA OBRA).

**CONSTRUCCION DE GUARNICION A BASE DE ADOQUIN Y COLOCACION DE
LETRERO**

Se da por concluida la obra de la construcción de Pavimentación en calle cofradía la cual fue intervenida con la rehabilitación de drenaje, toma domiciliaria y reparación de guarniciones y banquetas, se realiza la limpieza de terreno correspondiente y se deja en condiciones para poder usarla.



Latitud: 22.790857
Longitud: -102.56062
Altitud: 2485.8±6.62 m
Precisión: 1.6 m

 ZACATECAS GOBIERNO DEL ESTADO		FAISMUN	
NOMBRE DE LA OBRA PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN CUADRADO, EN CALLE COFRADIA, EN LOMAS DE BRACHO, ZACATECAS, ZAC.			
UBICACIÓN LOMAS DE BRACHO, ZACATECAS, ZAC.		VIVIENDAS 15	
ESTRUCTURA FINANCIERA			
TOTAL	ESTADO	MUNICIPIO	FEDERACION
100%		100%	

Latitud: 22.790857
Longitud: -102.56062
Elevación: 2480.13±3.46 m
Precisión: 1.4 m

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
