

004599

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

ZACATECAS
Capital de la Transformación

INFORME DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2023

INFORMACION GENERAL

Nombre: ANGÉLICA MARÍA MEDINA SORIA ID 21739	Modalidad: Municipal
Fecha de inicio de prestación de servicios: 01 de Marzo del 2023	Período reportado: 01 al 31 de Diciembre de 2023
Delegación Municipal: Zacatecas	Jefe director: M.T.I.E. CECILIA MONJARAZ FRAUSTO
1. Dirección: Calle Olivos # 302 colonia Las Margaritas Zacatecas, Zac.	Teléfono celular 492 102 89 64

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	ACTIVIDADES	FECHA
1	SEGUIMIENTO A LA OBRA 115788 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES, LOCALIDAD LA SOLEDAD (ENTREGA RECEPCIÓN)	18/12/2023
2	SEGUIMIENTO A LA OBRA 115845 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (ENTREGA RECEPCIÓN)	18/12/2023
3	SEGUIMIENTO A LA OBRA 115750 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD BENITO JUAREZ (ENTREGA RECEPCIÓN)	18/12/2023
4	SEGUIMIENTO A LA OBRA 215894 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD BENITO JUAREZ (ENTREGA RECEPCIÓN)	18/12/2023
5	SEGUIMIENTO A LA OBRA 116272 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA COLINAS DEL SOL (AVANCE FÍSICO).	20/12/2023
6	SEGUIMIENTO A LA OBRA 36066 REHABILITACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA 3 ZAP EN 3 CALLES PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	21/12/2023
7	SEGUIMIENTO A LA OBRA 360811 REHABILITACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA TRES CRUCES , CALLE ALFAREROS Y HOJALATEROS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	22/12/2023
8	SEGUIMIENTO A LA OBRA 106559 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD BENITO JUAREZ (AVANCE FÍSICO).	27/12/2023
9	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO AMPLIACIÓN FELIPE ANGELES.	27/12/2023
10	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA ALMA OBRERA.	28/12/2023
11 a 13	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA.	29/12/2023
14	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COLONIA 21 DE JULIO.	29/12/2023
15	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.	03/01/2024

**OPERADO FONDO PARA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

Prestador de Servicios Profesionales – Ing. Angélica María Medina Soria



16 a 19	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COLONIA 21 DE JULIO.	04/01/2024
20 y 21	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	04/01/2024
22 y 23	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COLONIA PÁNFILO NATERA	06/01/2024
24 a 27	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.	06/01/2024
28	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA BUENAVISTA.	06/01/2024
29 a 33	SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COLONIA H. AYUNTAMIENTO.	06/01/2023

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**


ING. ANGÉLICA MARÍA MEDINA SORIA

Nombre y Firma


M.T.I.E. CECILIA MONJARAZ FRAUSTO

Nombre y Firma del Jefe Director



18 de diciembre de 2023

1. SEGUIMIENTO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 115788 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS.

Se dio seguimiento a la obra de instalación de dos calentadores solares, en la etapa de entrega recepción de los trabajos, firmando el Comité de Participación Social el anexo 4 (acta de entrega recepción y reporte de resultados alcanzados por el CPS) ya que la obra ha sido verificada, observándose que se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución de acuerdo a las especificaciones e inversión programada para los trabajos.

Se anexa copia del acta de entrega recepción.

2. SEGUIMIENTO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 115845 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA.

Se dio seguimiento a la obra de instalación de un calentador solar, en la etapa de entrega recepción de los trabajos, firmando el Comité de Participación Social el anexo 4 (acta de entrega recepción y reporte de resultados alcanzados por el CPS) ya que la obra ha sido verificada, observándose que se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución y de acuerdo a las especificaciones e inversión programada para los trabajos.

Se anexa copia del acta de entrega recepción

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



3. SEGUIMIENTO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 115750 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS.

Se dio seguimiento a la obra de instalación de dos calentadores solares, en la etapa de entrega recepción de los trabajos, firmando el Comité de Participación Social el anexo 4 (acta de entrega recepción y reporte de resultados alcanzados por el CPS) ya que la obra ha sido verificada, observándose que se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución de acuerdo a las especificaciones e inversión programada para los trabajos.

Se anexa copia del acta de entrega recepción.

4. SEGUIMIENTO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 215894 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS.

Se dio seguimiento a la obra de instalación de dos calentadores solares, en la etapa de entrega recepción de los trabajos, firmando el Comité de Participación Social el anexo 4 (acta de entrega recepción y reporte de resultados alcanzados por el CPS) ya que la obra ha sido verificada, observándose que se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución de acuerdo a las especificaciones e inversión programada para los trabajos.

Se anexa copia del acta de entrega recepción

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



20 de diciembre 2023

5. SEGUIMIENTO A LA OBRA 116272 AMPLIACIÓN DE 64 ML DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PROPUESTA POR EL EJIDO ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS.

Se hizo visita de seguimiento a la obra de ampliación de red de agua potable y se observó que las excavaciones, cama de arena, tendido de tubería de 3" y relleno con material de banco sobre el lomo del tubo ya se ejecutaron, con estos trabajos el avance físico es aproximadamente el 80% de la obra. Únicamente falta la instalación de tres tomas domiciliarias, la prueba hidrostática y el relleno a volteo.



**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



21 de diciembre de 2023

6. SEGUIMIENTO A LA OBRA 360667 REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN ZACATECAS EN LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO VARIOS, 3 ZAP, EN 3 CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

Se dio seguimiento a la obra en el proceso de integración del Comité de Participación Social, el cual debe quedar integrado antes del inicio de la obra. El comité quedó conformado por cinco mujeres vecinas de la calle, con los cargos de Presidenta, Secretaria y tres vocales, quienes no desempeñan un cargo público y fueron designados de manera democrática. Se participó como facilitadora dando la información a los integrantes del CPS, a cerca de sus responsabilidades de acuerdo al cargo que se va a desempeñar, así como el seguimiento que le deberán dar a la obra, a través de los Anexos de participación social (APS) y se instruyó a cerca de cómo deberán realizar el llenado de estos.

22 de diciembre 2023

7. SEGUIMIENTO A LA OBRA 360811 REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO TRES CRUCES EN ZAP 0364 CALLE ALFAREROS Y HOJALATEROS, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

Se dio seguimiento a la obra en el proceso de integración del Comité de Participación Social, el cual debe quedar integrado antes del inicio de la obra. El comité quedó conformado por cinco mujeres vecinas de la calle, con los cargos de Presidenta, Secretaria y tres vocales, quienes no desempeñan un cargo público y fueron designados de manera democrática. Se participó como facilitadora dando la información a los integrantes del CPS, a cerca de sus responsabilidades de acuerdo al cargo que se va a desempeñar, así como el seguimiento que le deberán dar a la obra, a través de los Anexos de participación social (APS) y se instruyó a cerca de cómo deberán realizar el llenado de estos.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



27 de diciembre 2023

8. SEGUIMIENTO A LA OBRA 106559 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD BENITO JUAREZ.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Enrique Estrada # 502, con el fin de dar seguimiento a la construcción de un cuarto para baño, observándose un avance físico de un 50%, teniendo a la fecha la construcción en obra negra hasta la losa y pretilas. Salidas hidráulicas, sanitarias y eléctricas y un 80% de aplanados interiores y exteriores.

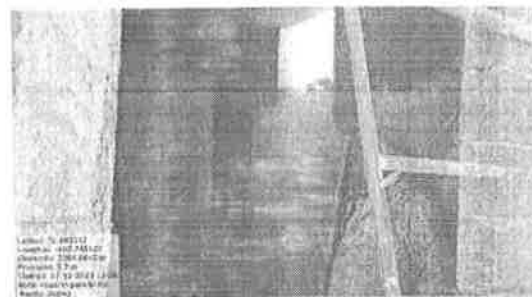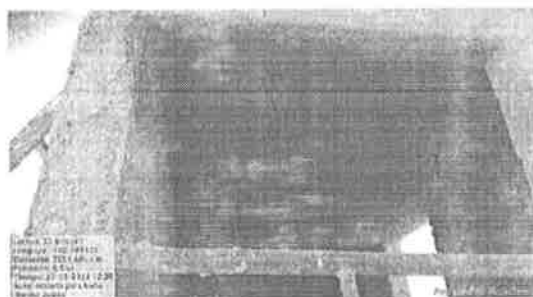

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



9. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA AMPLIACIÓN FELIPE ANGELES.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Francisco Villa # 118 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



28 de diciembre de 2023

10. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA ALMA OBRERA.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Alfonso Medina # 115 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



OPERADO FONDO PARA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



29 de diciembre de 2023

11. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Cerro del Padre # 211 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



12. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Cerro del Padre # 426 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



13. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Cerro del Padre # 213 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



14. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA 21 DE JULIO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Prolongación Centenario # 322 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



03 de enero 2024

15. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.


Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Ixtoc # 414 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en planta baja. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



04 de enero 2024

16. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA 21 DE JULIO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Prolongación la Rosita # 511 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en planta baja. A la fecha el tanque está instalado al 100%.

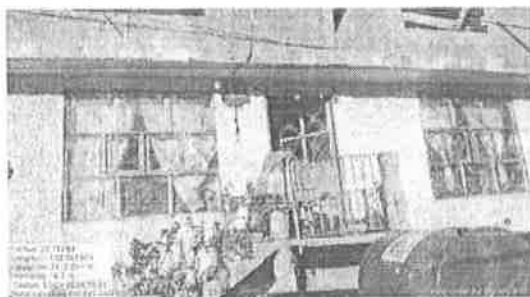

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**




17. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA 21 DE JULIO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Licenciados # 16, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en planta baja. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



18. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA 21 DE JULIO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Prolongación Zacatecas # 108, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.

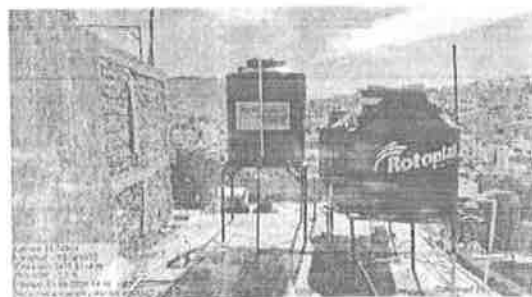

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL




19. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA 21 DE JULIO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Topógrafos # 105 A con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



20. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Ixtoc # 404 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.

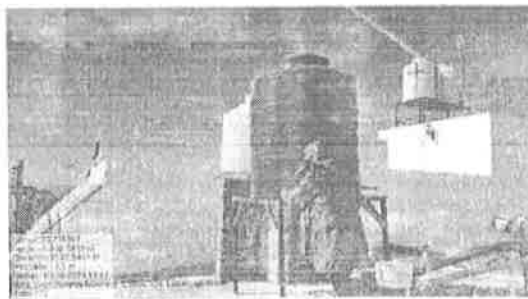

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



21. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.


Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Veracruz # 415 con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en planta baja. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



06 de enero de 2024

22. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA PÁNFILO NATERA.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la avenida Pánfilo Natera # 403, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.

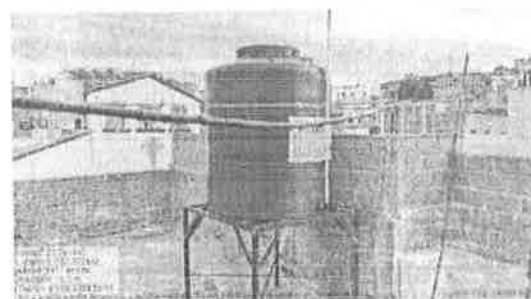

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

23. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA PÁNFILO NATERA.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle J. Trinidad Cervantes # 208, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



24. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Veracruz # 402, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL




25. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Benito López Domínguez # 102 A, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



26. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Expropiación Petrolera # 703, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.

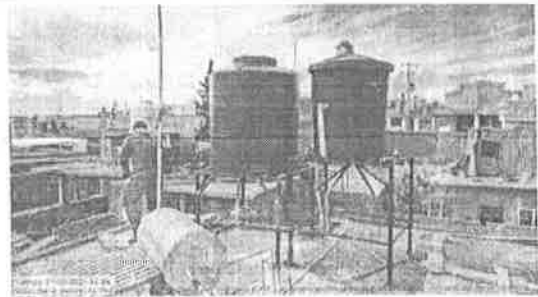

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



27. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Rubén Jaramillo # 115, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



28. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA BUENAVISTA.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle San Carlos # 103, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.




OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL




29. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA H. AYUNTAMIENTO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle José Árbol y Bonilla # 103 A, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.

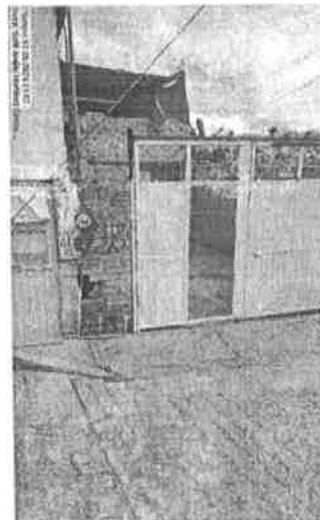

30. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA H. AYUNTAMIENTO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Arturo Espino # 321, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.

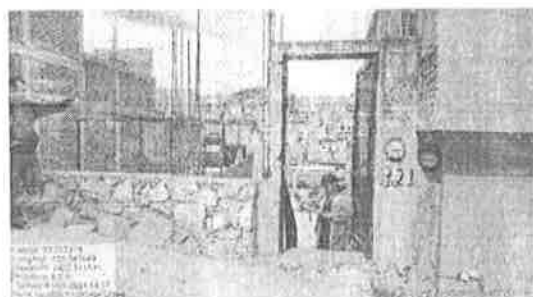

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



31. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA H. AYUNTAMIENTO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Francisco Berumen # 510, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



32. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA H. AYUNTAMIENTO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle Francisco Berumen # 607, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



33. SEGUIMIENTO A LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COLONIA H. AYUNTAMIENTO.

Se hizo una visita en el domicilio ubicado en la calle José Arbol y Bonilla # 111, con el fin de dar seguimiento a la instalación de un tanque de almacenamiento en azotea. A la fecha el tanque está instalado al 100%.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
