

000943

000955

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

**ZAGATECAS**
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027**SERVICIO 9 DE ACTIVIDADES****INFORMACION GENERAL**

Nombre: ANGÉLICA MARÍA MEDINA SORIA 110828	Modalidad: Municipal
Fecha de inicio de prestación de servicios: 16 de Septiembre del 2024	Período reportado: servicio 9
Delegación Municipal: Zacatecas	Jefe director: Dra. Nancy Espinoza Medina
1. Dirección: Calle Olivos # 302 colonia Las Margaritas Zacatecas, Zac.	Teléfono celular: 492 102 89 64

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	ACTIVIDADES	FECHA
1	SEGUIMIENTO TECHO FIRME COLONIA ESTRELLA DE ORO.	
2	SEGUIMIENTO RED DE DRENAJE CALERILLA DE TULA.	
3	SEGUIMIENTO TECHO FIRME COLONIA EUROPA.	
4	SEGUIMIENTO J.N. LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO.	
5	SEGUIMIENTO TECHO FIRME COLONIA EUROPA.	
6 y 7	SEGUIMIENTO REENCARPETAMIENTO COLONIA FELIPE ANGELES.	
3 y 9	SEGUIMIENTO REENCARPETAMIENTO COLONIA TOMA DE ZACATECAS.	
10	SEGUIMIENTO RED DE DRENAJE LOCALIDAD CALERILLA DE TULA.	

ING. ANGÉLICA MARÍA MEDINA SORIA
Nombre y Firma
LIC. MARIA VERONICA VÁZQUEZ MORUA
Auxiliar Administrativo (Técnico MIDS)
DRA. NANCY ESPINOZA MEDINA
Encargada de la Secretaría De Desarrollo Social**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



1. SEGUIMIENTO REENCARPETAMIENTO COLONIA TOMA DE ZACATECAS.

Se visitó la calle Joaquín Arrieta, con el fin de dar seguimiento a la obra de reencarpetamiento con concreto asfáltico (obra financiada con recursos del FAIS). Como resultado de la visita se observa que los 965.00 m2 programados de carpeta, están aplicados. Por lo tanto, la obra se encuentra concluida y operando.



**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



2. VERIFICACIÓN APLIACIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA GONZALO GARCÍA GARCÍA

Se hizo visita de verificación en la calle Camino a las Antenas conjuntamente con el supervisor de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, con el fin de atender una solicitud que presentaron los representantes de la colonia para la ampliación de la red de drenaje en esta calle. Debido a que existe la necesidad del servicio para los vecinos de la calle, se presentará la propuesta para que se considere dentro de las obras de infraestructura básica que serán financiadas con recursos del FAIS.



**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

000946

000958

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL



ZAGATECAS

3. VERIFICACIÓN PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO

Se hizo visita de verificación en la calle Miguel Auza, con el fin de atender una solicitud presentada por los vecinos de la localidad, para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle. Debido a que cumple con los requerimientos señalados en los lineamientos del FAIS, se hará la propuesta para que forme parte de las obras de infraestructura urbana que pueden ser financiadas con este fondo.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



4. VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD FRANCISCO I. MADÉRO

Se hizo visita de verificación en la calle Colima y González Ortega, con el fin de atender una solicitud presentada por los vecinos de la localidad para la ampliación de la red de agua potable. Debido a que cumple con los requerimientos señalados en los lineamientos del FAIS, se hará la propuesta para que forme parte de las obras de infraestructura básica que pueden ser financiadas con este fondo.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL


000948

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

000960
ZAGATECAS

5. SEGUIMIENTO REENCARPETAMIENTO COLONIA HIDRÁULICA.

Se visitó la calle Río Pánuco, con el fin de dar seguimiento a la obra de reencarpetamiento con concreto asfáltico (obra financiada con recursos del FAIS). Como resultado de la visita se observa que los 1038.00 m2 programados de carpeta, están aplicados. Por lo tanto, la obra se encuentra concluida y operando.

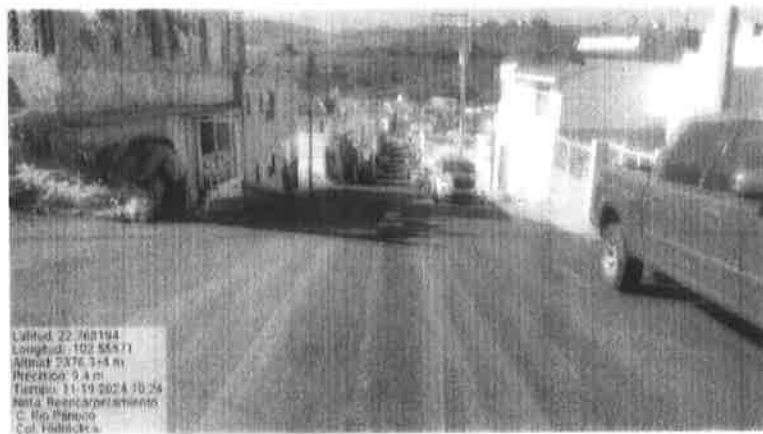

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

6. SEGUIMIENTO REENCARPETAMIENTO COLONIA AGRONOMICA.

Se visitó la calle de la Vid, con el fin de dar seguimiento a la obra de reencarpetamiento con concreto asfáltico (obra financiada con recursos del FAIS). Como resultado de la visita se observa que los 1124.00 m2 programados de carpeta, están aplicados. Por lo tanto, la obra se encuentra concluida y operando



**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

**7. SEGUIMIENTO REENCARPETAMIENTO COLONIA H. AYUNTAMIENTO.**

Se visitó la calle de la Joaquín Amaro, con el fin de dar seguimiento a la obra de reencarpetamiento con concreto asfáltico (obra financiada con recursos del FAIS). Como resultado de la visita se observa que los 289.00 m2 programados de carpeta, están aplicados. Por lo tanto, la obra se encuentra concluida y operando



Latitud: 22.75291
Longitud: -102.55653
Elevación: 2448.517 m
Proyección: UTM
Tiempo: 11-07-2024 09:23
Nota: SF REENCARPETAM
Joaquín Amaro
H. Ayuntamiento



Latitud: 22.751475
Longitud: -102.556438
Elevación: 2345.1175 m
Proyección: UTM
Tiempo: 11-07-2024 09:24
Nota: SF REENCARPETAM
Joaquín Amaro
H. Ayuntamiento




Latitud: 22.75155
Longitud: -102.556165
Elevación: 2345.1127 m
Proyección: UTM
Tiempo: 11-07-2024 09:24
Nota: SF REENCARPETAM
Joaquín Amaro
H. Ayuntamiento

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

**8. SEGUIMIENTO TECHO FIRME COLONIA ESTRELLA DE ORO.**

Se visitó el domicilio ubicado en calle Av. De la Plata, con el fin de dar seguimiento al apoyo que se otorgó para la construcción de un "Techo Firme" financiado con recursos del FAIS. En esta visita se observó que está colocada la cimbra, lo que representa un avance físico del 15%.

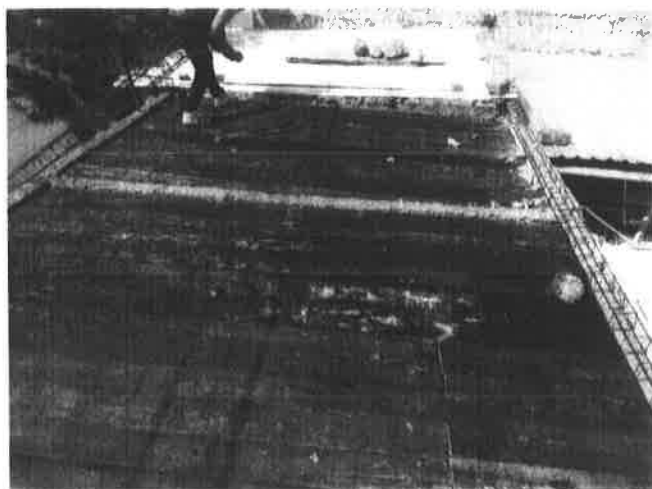

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



9. SEGUIMIENTO REENCARPETAMIENTO COLONIA PANFILO NATERA.

Se visitó la calle de la Ricardo Flores Magón, con el fin de dar seguimiento a la obra de reencarpetamiento con concreto asfáltico (obra financiada con recursos del FAIS). Como resultado de la visita se observa que los 937.00 m2 programados de carpeta están aplicados. Por lo tanto, la obra se encuentra concluida y operando



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



10. SEGUIMIENTO REENCARPETAMIENTO COLONIA PANFILO NATERA.

Se visitó la calle de la Rosendo Rayas, con el fin de dar seguimiento a la obra de reencarpetamiento con concreto asfáltico (obra financiada con recursos del FAIS). Como resultado de la visita se observa que los 931.00 m2 programados de carpeta están aplicados. Por lo tanto, la obra se encuentra concluida y operando



Latitude: 22.704568
Longitude: -102.672144
Elevation: 2430.6243 m
Precision: 9.4 m
Tiempo: 11-07-2024 09:07
Nota: SE REENCARPETAMIENTO
RICARDO FLORES MAGON
PANFILO NATERA

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**
