

**ZACATECAS**
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

INFORME DE ACTIVIDADES SERVICIO No.9**INFORMACION GENERAL**

Nombre: <u>Delia Nohemi Pérez Mauricio</u>	ID: 110828	Número de Contrato: PMZ-SOPM-CPS-004-2024	Modalidad: Municipal
Fecha de inicio de prestación de servicios: 17 de SEPTIEMBRE del 2024		Período reportado: SERVICIO No. 9	
Delegación Municipal: Zacatecas		Jefe directo: DRA. NANCY ESPINOZA MEDINA	
Dirección: Andador San Isidro Labrador #, Col. Francisco Herrera			Teléfono celular: 496-137-26-79

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1	SEGUIMIENTO A CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE	
2	SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO	
3	SEGUIMIENTO A ESCUELA MANUEL M. PONCE COL. ALMA OBRERA	
4	SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO	
5	SEGUIMIENTO A TECHO FIRME	
6 AL 7	SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO	
8	SEGUIMIENTO A ESCUELA MANUEL M. PONCE COL. ALMA OBRERA	
9	SEGUIMIENTO A AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACAETCAS, ASENTAMIENTO KOREA SUR, ZAP 220A, EN 4 CALLES CON 473 ML PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS	
10	SEGUIMIENTO A AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACAETCAS, ASENTAMIENTO KOREA SUR, ZAP 220A, EN 7 CALLES CON 1,569.18 ML PARA BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS	


ING. DELIA NOHEMI PÉREZ MAURICIO

Nombre y Firma


LIC. MARIA VERONICA VAZQUEZ MORUA

Auxiliar Administrativo (Técnico MIDS)


DRA. NANCY ESPINOZA MEDINA

Encargada de la Secretaría De Desarrollo Social

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

1. SEGUIMIENTO A CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE.

Se visitó la calle Morelos #14, Col. El Orito para darle seguimiento a los trabajos de la obra **“CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO, CON UN BAÑO INCLUYENTE EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA”**, a la continuación de los trabajos se puede observar que ya se hicieron alguno de los acuerdo que se levantaron los cuales son:

- ✓ Se concluyó con el acabado de la cimentación para resanar.



- ✓ Se concluyó también con el trabajo del descanso y los escalones acordados



- ✓ Se empezó a trabajar con la construcción de los dos registros.



FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

000793


2. SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO

Se visitó la calle Del Grillo, Col. Bancomer para empezar con los trabajos de dicha calle, en la visita a los trabajos se observa que empezaron en el tramo de calle Del Auxilio esquina con la Del Grillo teniendo un avance del 35% quedándose en la intersección de la calle Eduardo G. Pankhurst.



3. SEGUIMIENTO A ESCUELA MANUEL M. PONCE

Se visitó la escuela Manuel M. Ponce de la Col. Popular CTM para darle el seguimiento a la obra **“REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M PONCE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM”**, se hizo la vista con el Supervisor de INZACE el Arq. Víctor Hugo Román Ortiz y la empresa con el Arq. Carlos Vargas Carrillo para dar arranque a los trabajos que se harán en el área de los baños.

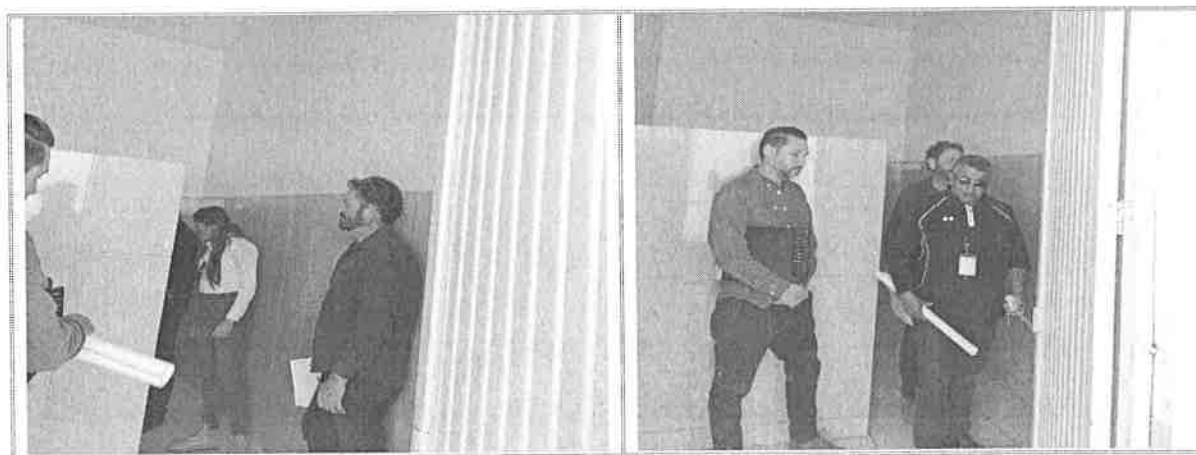

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

000797

000794


4. SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO

Se visitó la calle Del Grillo, Col. Bancomer para continuar con los trabajos de dicha calle, en la visita a los trabajos se observa que continuaron con los trabajos pendientes de la intersección calle Eduardo G. Pankhurst con la calle Del Grillo llevando un avance del 75% quedándose en la intersección de la calle De Ramos.



5. SEGUIMIENTO A TECHO FIRME.

Se visitó la calle Santa Isabel #115-C, Loc. Lomas de Bracho para darle seguimiento a los trabajos de la obra **“CONSTRUCCION DE 36.868 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA”**, para darle el seguimiento se puede observar que ya se encuentra colada la losa y que están trabajando en ella.

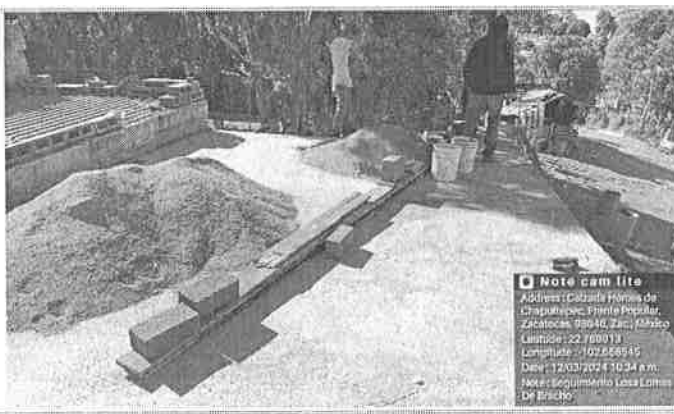

OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

000795


6. SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO

Se visitó la calle Del Grillo, Col. Bancomer para continuar con los trabajos de dicha calle, en la visita a los trabajos se observa que continuaron con los trabajos pendientes de la intersección calle De Ramos con la calle Del Grillo dando por terminado los trabajos correspondientes a dicho reencarpetamiento teniendo el 100%



7. SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO

Se visitó la calle Michoacán, Col. Lázaro Cárdenas para empezar con los trabajos de dicha calle, en la visita a los trabajos se observa que empezaron en la calle de la parte de arriba conocida como Privada Michoacán llevando un avance del 30%

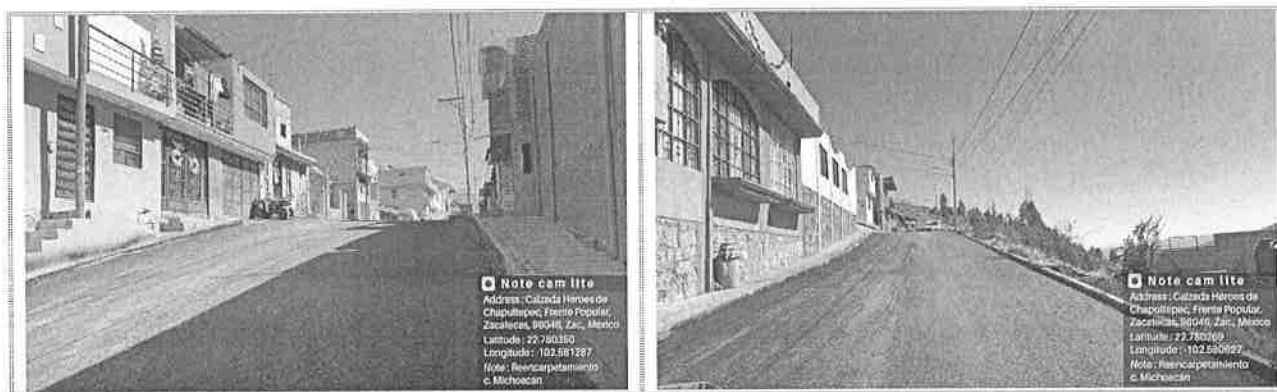

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

000799


000796

8. SEGUIMIENTO A ESCUELA MANUEL M. PONCE


Se visitó la escuela Manuel M. Ponce de la Col. Popular CTM para darle el seguimiento a la obra **“REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M PONCE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM”**, se hizo la vista con el Supervisor de INZACE el Arq. Víctor Hugo Román Ortiz para darle el seguimiento y se puede observar que ya se encuentran concluida las acciones de desmantelamiento de muebles sanitarios, puertas, mamparas.



De igual forma están concluidas las acciones de demolición de piso, loseta de cerámica, firme de concreto, de lambrin. El desmontaje de soquete y focos.

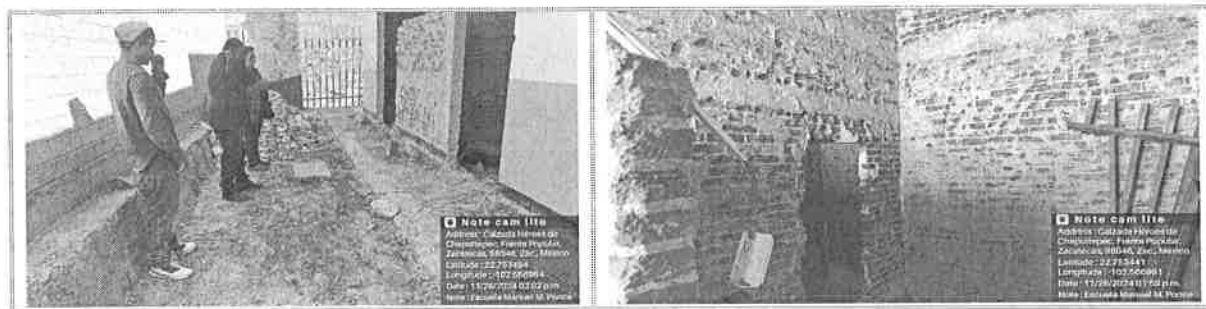

Se observó que ya se encuentran instalados los módulos sanitarios portátiles, dándoles limpieza tres veces por semana.

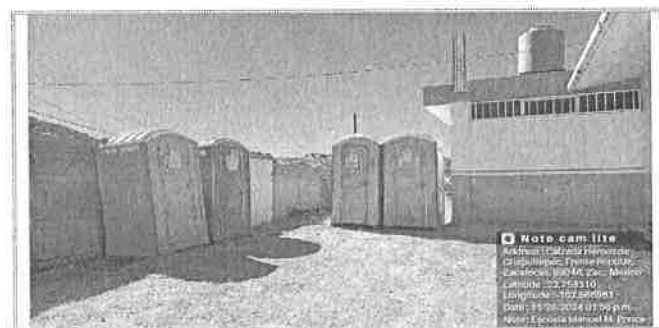

**OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**

Prestador de Servicios Profesionales – Ing. Delia Noherní Pérez Mauricio
